
Name	Arbeitspaket	Datum	geplante Dauer	tatsächliche Dauer	Ergebnis
Kostroun	Projektantrag	30.09.	2018 0,5	0,5	Projektdaten, Projektorganisation fertiggestellt
Omar	Projektantrag	02.10.	2018 1,0	1,0	Projektziele, Hauptaufgaben abgeschlossen
Gagajew	Projektantrag	02.10.	2018 0,5	0,5	Nicht-Ziele, Projektrisiken abgeschlossen
Dzindzihasvili	Projektantrag	03.10.	2018 0,5	0,5	Projektbudget & Wirtschaftlichkeit, Projektkategorisierung fertiggestellt
Omar	Lastenheft	05.10.	2018 0,5	0,5	Einführung
Gagajew	Lastenheft	07.10.	2018 1,0	1,5	Zielbestimmung, 50% Produktfunktionen abgeschlossen
Dzindzihasvili	Lastenheft	10.10.	2018 1,0	1,0	70% Produktfunktionen abgeschlossen
Kostroun	Lastenheft	10.10.	2018 1,0	1,0	90% Produktfunktionen abgeschlossen
Omar	Lastenheft	12.10.	2018 0,5	1,0	Qualitätsanforderungen fertiggestellt
Gagajew	Lastenheft	13.10.	2018 1,0	1,0	Vertragsgegenstand, Zwingende Randbedingungen fertiggestellt
Kostroun	Lastenheft	13.10.	2018 0,5	1,0	Fehlerkorrektur durchgeführt
Dzindzihasvili	Lastenheft	14.10.	2018 1,0	1,0	100% Produktfunktionen abgeschlossen, Fehlerkorrektur durchgeführt, Abgabe

Arbeitspaket	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Projektantrag	2,5	2,5
Lastenheft	6,5	8,0
Machbarkeitsstudie		
Pflichtenheft		
GESAMT	9,0	10,5

Name	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer	
Kostroun	2,0		2,5
Omar	2,0		2,5
Dzindzihashvili	2,5		2,5
Gagajew	2,5		3,0
GESAMT	9,0		10,5

## Vorprojekt




Name	Arbeitspaket	Arbeit	Datum	geplante Dauer	tatsächliche Dauer	Ergebnis
Dzindzihashvili	Projektkoordination	Arbeitsaufteilung	20.09.2018	1,0	1,0	Jedem Teammitglied wurde Arbeit zugeteilt
Omar	Projektmarketing	Projektpräsentation	10.10.2018	1,0	1,0	30% Projektpräsentation abgeschlossen
Kostroun	Projektcontroling	Projekthandbuch	11.10.2018	1,0	1,5	Projektauftrag, Projektzielplan, Projektumweltengrafik, Projektumweltenbeziehungen
Gagajew	Projektmarketing	Projektpräsentation	13.10.2018	0,5	1,0	60% Präsentation abgeschlossen
Dzindzihashvili	Projektmarketing	Projektpräsentation	14.10.2018	0,5	1,0	80% Präsentation abgeschlossen
Omar	Projektkoordination	Projektmeeting	15.10.2018	1,0	1,0	Fortschritt und Präsentation des Projekt im Team besprochen
Kostroun	Projektcontroling	Projekthandbuch	16.10.2018	1,0	0,5	Projektorganigramm, Projektorganisation, Projektstrukturplan, Projektfunktionendiagramm
Gagajew	Projetkmarketing	Projektpräsentation	16.10.2018	0,5	1,0	100% Präsentation fertiggestellt
Omar	Projektmarketing	Projekpräsentation	17.10.2018	1,0	1,0	Präsentation vorgetragen

Arbeitspaket	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer	
Prjektkoordination	2,0		2,0
Projektcontroling	2,0		2,0
Projektabschluss			
Projektmarketing	3,5		5,0
GESAMT	7,5		9,0

Name	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Kostroun	2,0	2,0
Omar	2,0	2,0
Gagajew	1,0	2,0
Dzindzihashvili	1,5	2,0
GESAMT	6,5	8,0

## Projektmanagement

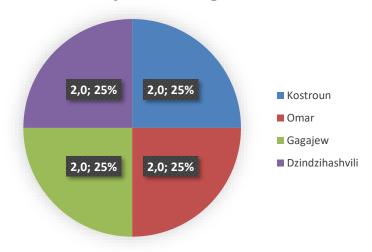

Name	Arbeitspaket	Arbeit	Datum	geplante Dauer tatsächliche Dauer	Ergebnis

Arbeitspaket	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Oberfächen-Gestaltung		
Datenbankkonfiguration		
Hauptfunktionen		
GESAMT		

Name	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Kostroun		
Omar		
Gagajew		
Dzindzihashvili		
GESAMT		

Name	Arbeitspaket	Arbeit	Datum	geplante Dauer	tatsächliche Dauer	Ergebnis
					_	
	┪					

Arbeitspaket	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer	
Detailergänzung			
Datenbankfunktionsspezifikation			
Datenbankperfektion			
GESAMT			

Name	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Kostroun		
Omar		
Gagajew		
Dzindzihashvili		
GESAMT		

Name	Arbeitspaket	Arbeit	Datum	geplante Dauer tatsächliche Dauer	Ergebnis
<u> </u>					

Arbeitspaket	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Funktionstest		
Schnittstellentest		
Kompatibilitätstest		
Gesamtsystemtest		
Abnahme		
GESAMT		

Name	geplante Gesamtdauer	tatsächliche Gesamtdauer
Kostroun		
Omar		
Gagajew		
Dzindzihashvili		
GESAMT		

		geplante Dauer	tatsächliche Dauer
Projektmanagement		Behames - and	
, ,	Projektkoordination		
	Projektcontroling		
	Projektabschluss		
	Projektmarketing		
Grobentwicklung			
	Datenbankkonfiguration		
	Hauptfunktionen		
	Oberflächeng-Gestaltung		
	Verschlüsselung und Authentifizierung		
Feinentwicklung			
	Detailergänzung		
	Datenbankfunktionsspezifikation		
	Datenbankperfektion		
Tests und Abnahme			
	Funktionstest		
	Schnittstellentest		
	Kompatibilitätstest		
	Gesamttest		
	Abnahme		
GESAMT		Ī	
